




Instalación AMIS 2023 y proyecciones 2024


# Estado actual AMI

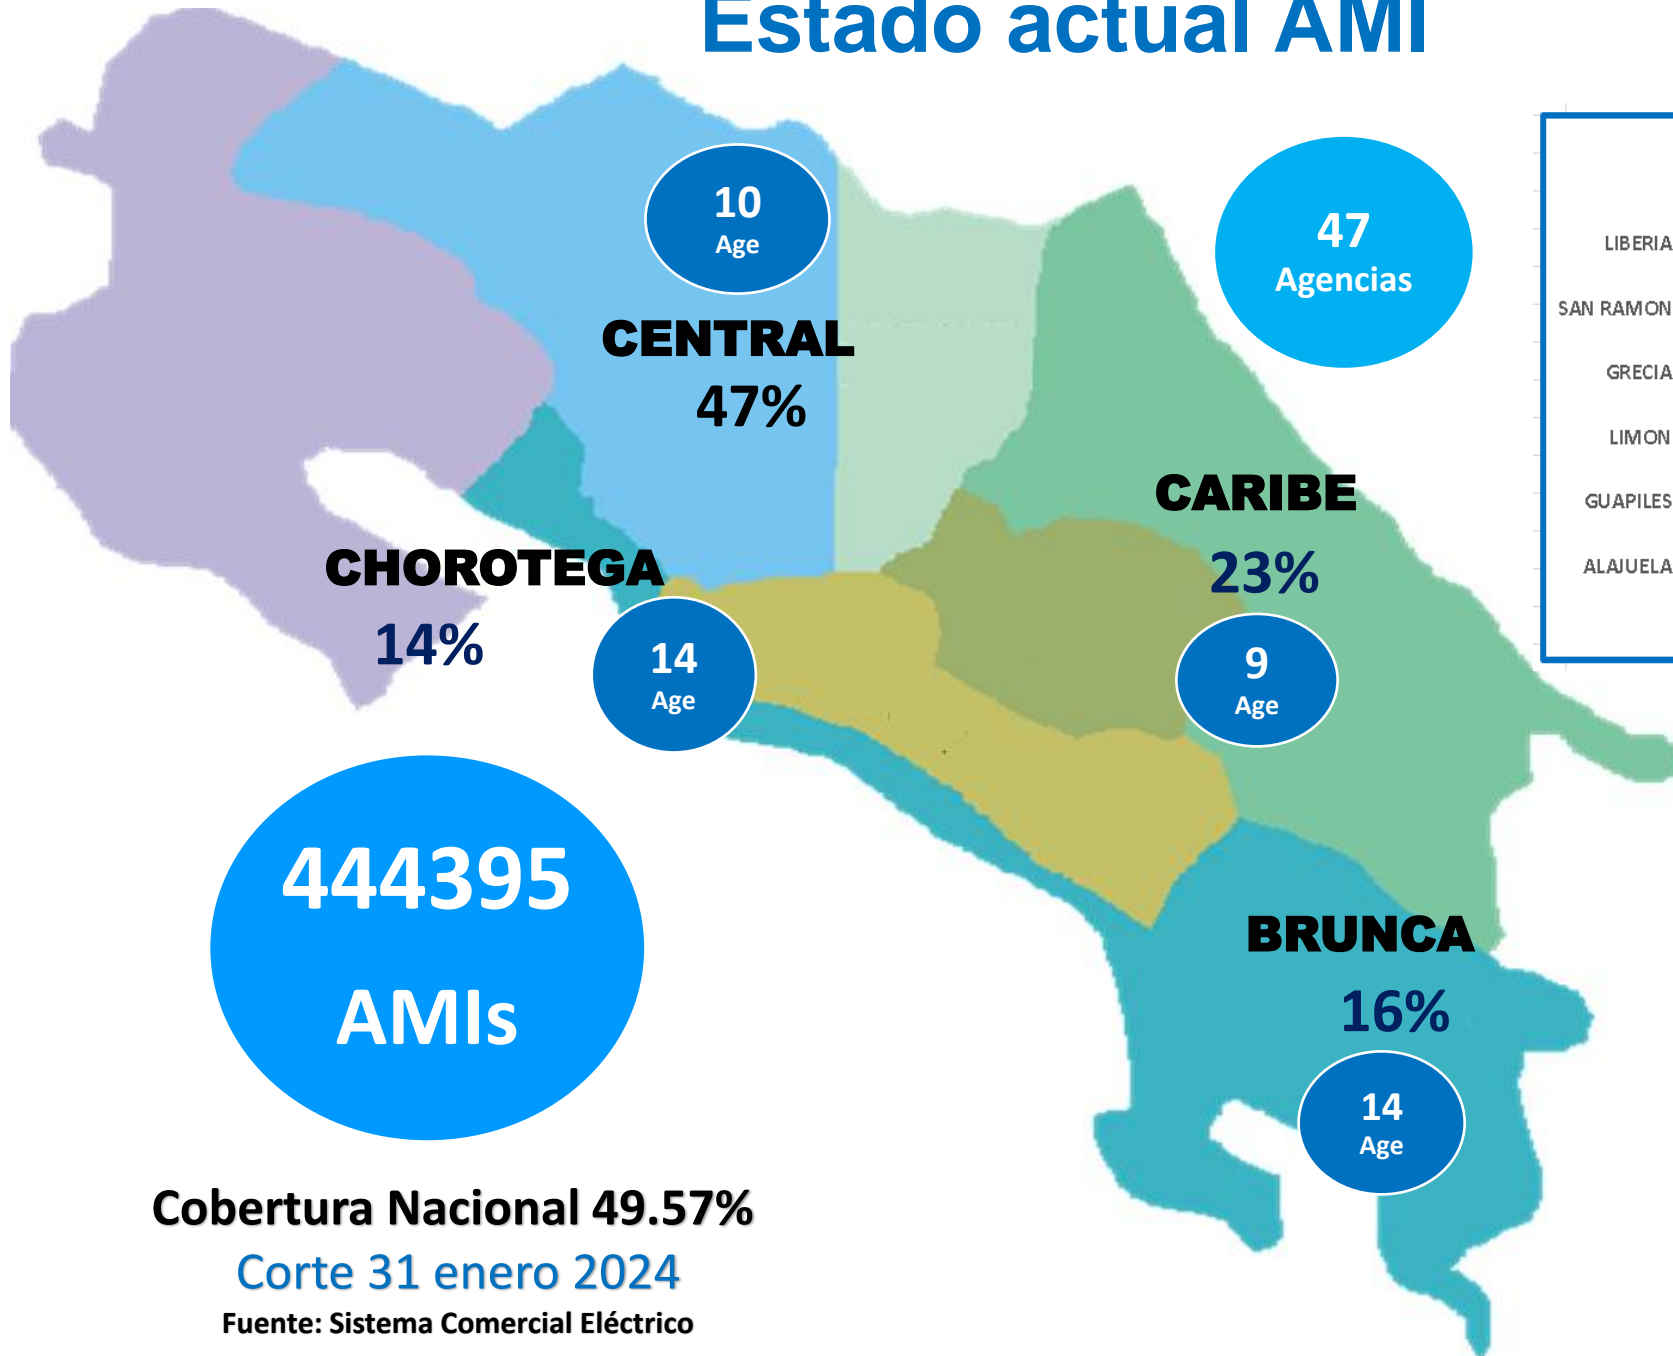

**Cobertura Nacional 49.57%**

Corte 31 enero 2024


Fuente: Sistema Comercial Eléctrico

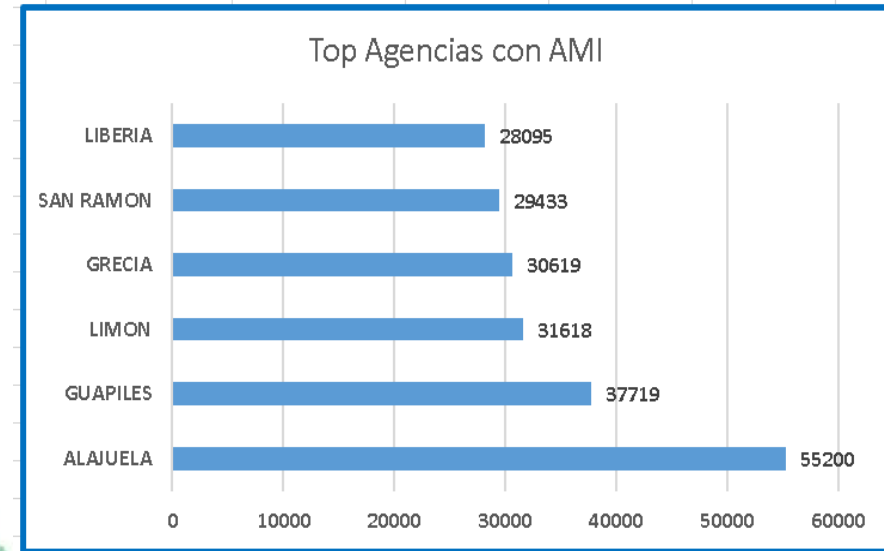


Corte 31 enero 2024

Fuente: Sistema Comercial Eléctrico

### Parque de Medidores ICE

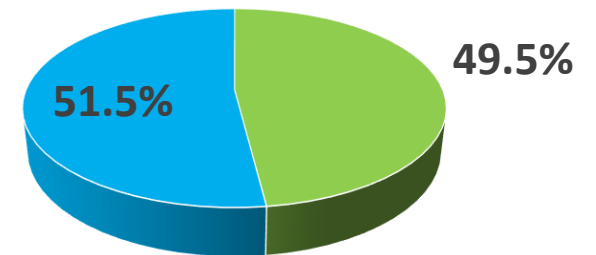

# Mapa Cobertura AMI - ICE

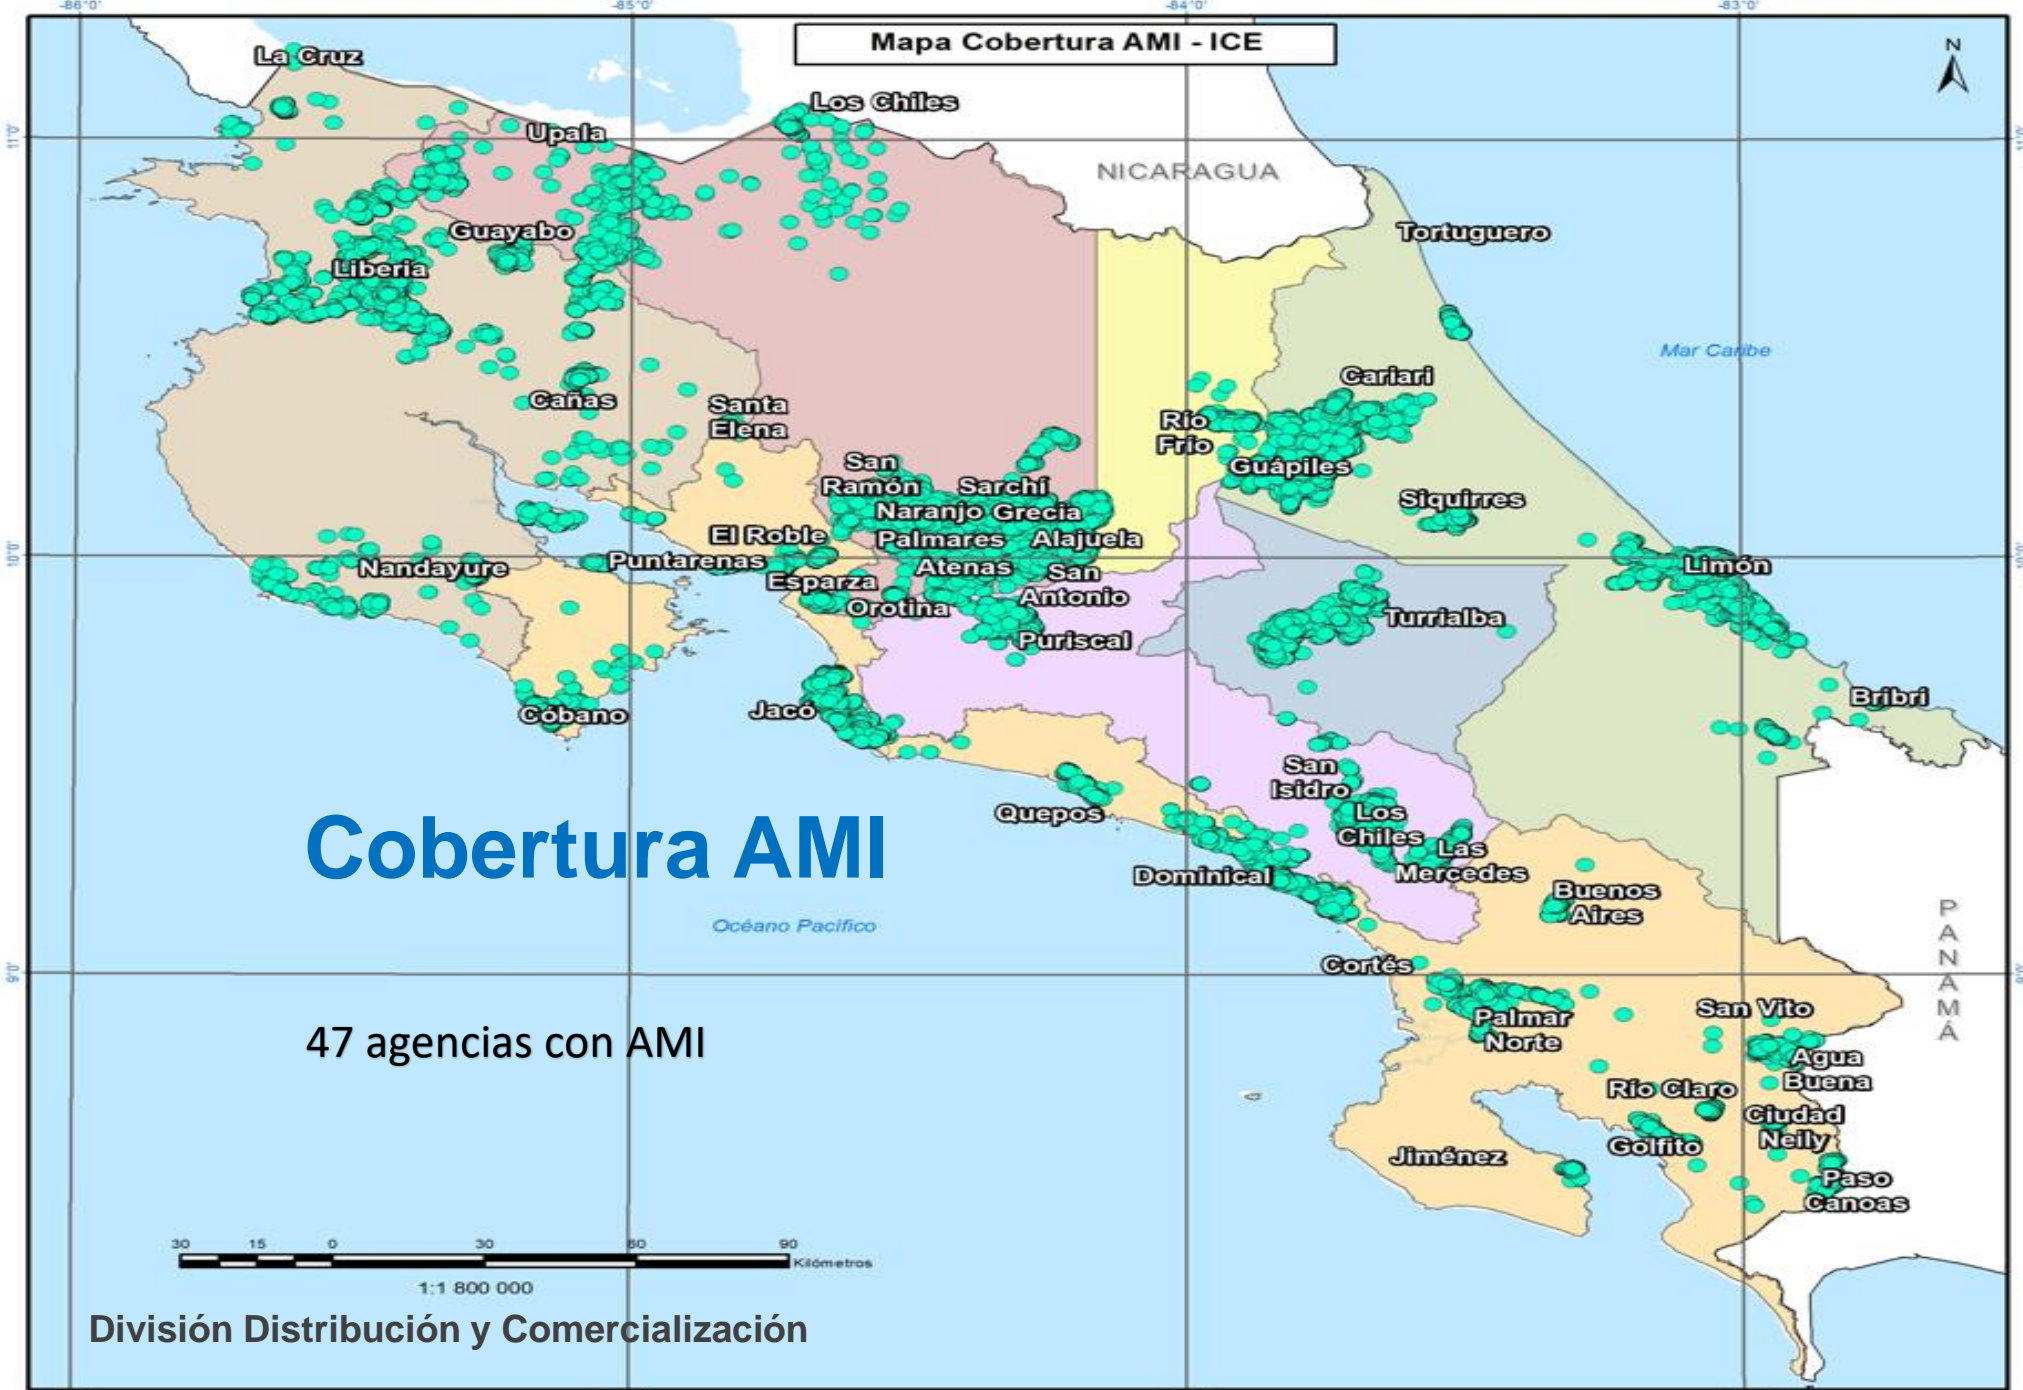

**Simbología**


- Poblados
- Medidores AMI

**Provincias**

- Alajuela
- Cartago
- Guanacaste
- Heredia
- Limón
- Puntarenas
- San José

## Cobertura AMI

47 agencias con AMI



División Distribución y Comercialización

Enero 2024  
Fuente: Sistema SIRDE ICE

Sistema Coordenadas Geográficas: WGS84  
Elaborado: SIRDE, DDyC. ICE.  
Fecha: febrero 2024  
Fuente: - SIRDE, 2024. - GISENE, 2024.



# Capacidades desarrolladas




## Tarifa residencial horaria

**Definición de horario**

Punta 1: entre las 10:01 y las 13:00 horas  
 Punta 2: entre las 18:01 y las 21:00 horas  
 Valle 1: entre las 05:31 y las 10:00 horas  
 Valle 2: entre las 13:01 y las 18:00 horas  
 Valle 3: entre las 21:01 y las 23:00 horas  
 Nocturno: entre las 23:01 y las 05:30 horas

## Electricidad Prepago

## Analítica de datos

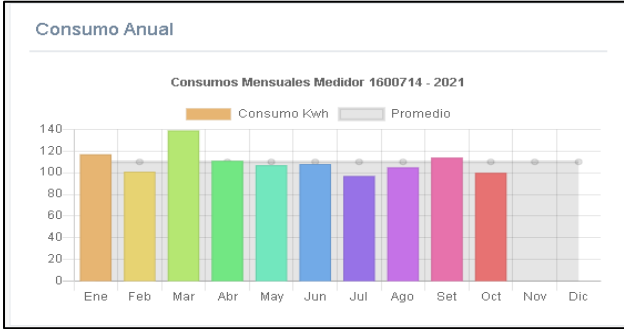


## Generación Distribuida



## AMI Agua

## Estudios técnicos

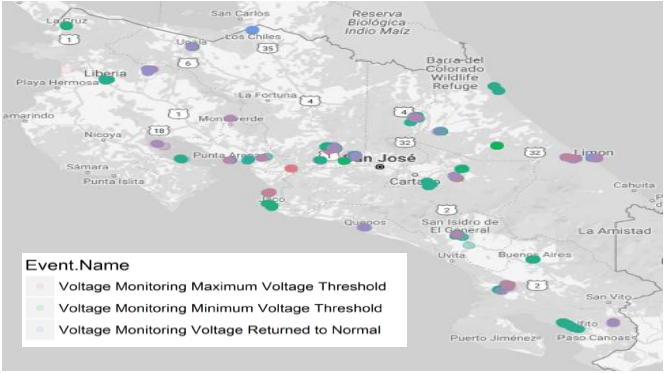

# Estado Licitación AMI BID

## Adjudicación Sesión CD 01/02/2023

80% Adjudicado

### POR TANTO, POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Adjudicar la Licitación Pública Internacional 2021LI-000007-PROV, promovida para la adquisición de medidores con comunicación remota con radio frecuencia AMI RF (Medidores inteligentes), de la siguiente manera:

**MONTO TOTAL RECOMENDADO: 10 470 716,97 USD**

#### PLAZO DE ENTREGA:

Plazo de entrega de 1 a 790 días naturales.

No. Art	Descripción	Cant. Inicial	Cant. Adjudicada
1	MEDIDOR FM2S, CON CORTA Y DESCONEXIÓN REMOTA. LICENCIA INCLUIDA.	106,000	84,800
2	MEDIDOR FM12S. LICENCIA INCLUIDA	200	160
3	MEDIDOR FM16S, LICENCIA INCLUIDA.	500	400
4	MEDIDOR FORMA FM10A, LICENCIA INCLUIDA.	300	240
5	COLECTOR DE DATOS	172	138
6	EQUIPO PORTATIL PARA CAMPO CON RADIO RF	16	13



- Estado actual:
- ✓ Recibida la totalidad de entregas.
  - ✓ Realizados la totalidad de pagos.
  - ✓ Instalación de 85K medidores entre 2024-2025.

Avance en la instalación: **3150 medidores (enero 2024)**

# Estimación de instalación

**Meta SLB**

**502 000**  
Año 2025

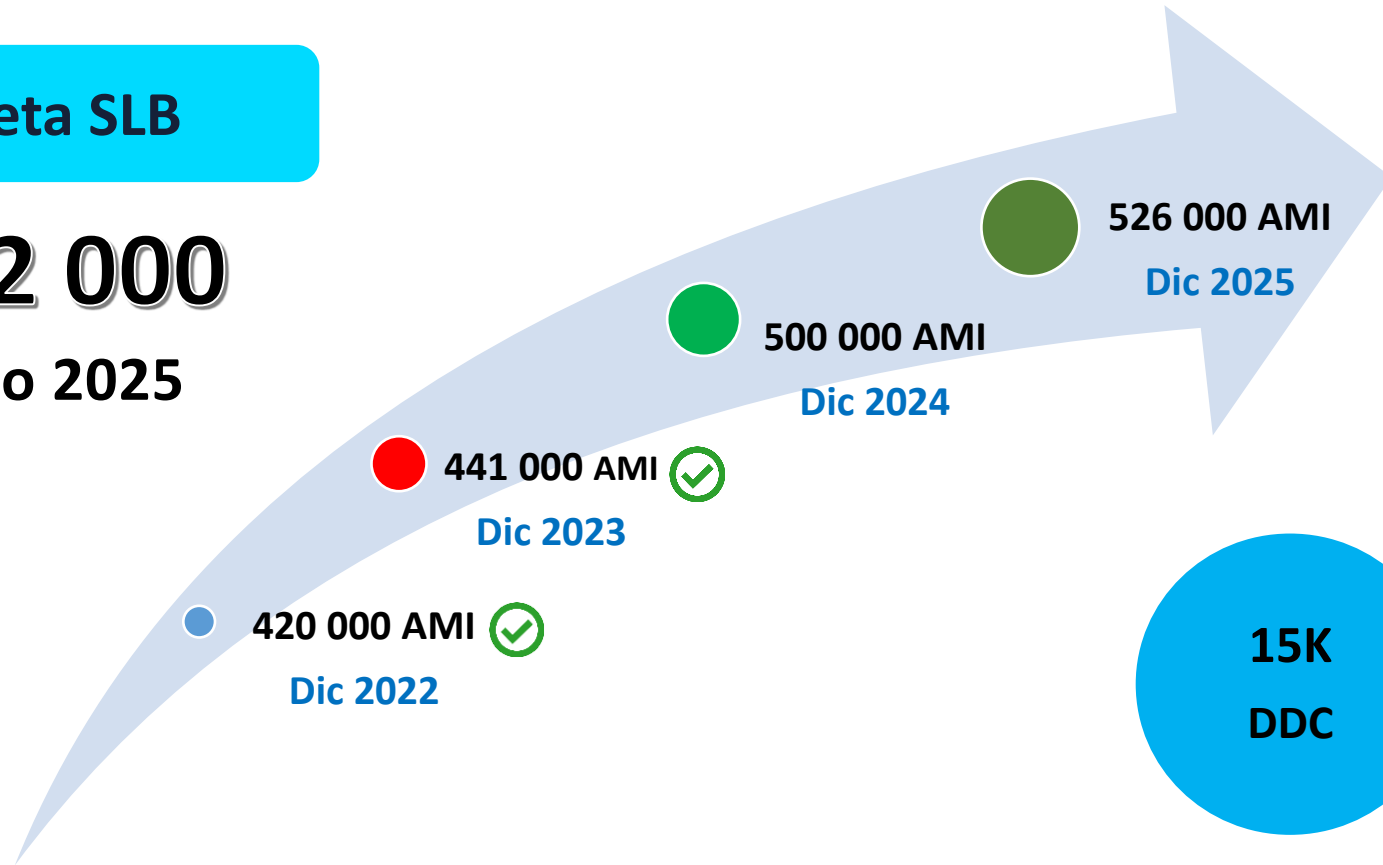

2024-2025



2024-2025

✔ Datos reales ya instalados.



**GRACIAS**
